Operator: Aera Energy LLC
Well: VLW118
Type: Injector
Wellbore: 01
API : 0411105027

Status: Active

Wellbore Schematic

Datum: KELLY BUSHING @ 699.90ft (NABORS WELL Doubles Rig)(default)
Ground Elev: 676.90ft
PBMD: 11,725ft
TD MD: 11,838ft
Orientation: Directional
Spud / KO Date: 12/19/1979

CASING

Size(in)	Top MD(ft)	Base MD(ft)
16.0000	23	84.0
10.7500	23	3,620.0
7.0000	23	11,831.0

CEMENT STAGES

Csg Size	Hole Size(in)	Top MD(ft)	Btm MD(ft)

REMARKS

UIC Project Code(s)

UIC: 8140003 - D6/7U (E) VLW

BASE OF USDW

Base MD (ft) 2689

BASE OF FRESH WATER

Base MD (ft) N/A

PERFORATIONS

Top MD(ft)	Bottom MD(ft)	Density(shot/ft)
9,845.00	9,966.00	4.00
10,028.00	10,093.00	4.00
10,142.00	10,257.00	4.00
10,351.00	10,422.00	4.00
10,577.00	10,578.00	4.00
10,628.00	10,665.00	4.00
10,703.00	10,718.00	4.00
10,748.00	10,761.00	4.00
10,798.00	10,824.00	4.00
10,833.00	10,834.00	4.00
10,884.00	10,918.00	4.00
10,925.00	10,950.00	4.00
10,973.00	11,001.00	4.00
11,061.00	11,079.00	4.00
11,109.00	11,110.00	4.00
11,145.00	11,178.00	4.00
11,221.00	11,244.00	4.00
11,264.00	11,288.00	4.00
11,298.00	11,299.00	4.00
11,331.00	11,442.00	4.00
11,454.00	11,466.00	4.00
11,486.00	11,500.00	4.00
11,511.00	11,526.00	4.00
11,531.00	11,572.00	4.00
11,585.00	11,630.00	4.00

PLUG DETAILS

Assembly name: Injection Tubing & Attached Items

Type	Top MD(ft)	Btm MD(ft)
Tubing Hanger	23	24
X-Over	24	24
Pup Joint	24	28
Tubing	28	3,225
Tubing Fatigue Nipple	3,225	3,233
Tubing	3,233	8,196
Tubing Fatigue Nipple	8,196	8,197
Tubing	8,197	8,261
Packer	8,261	8,270
Tubing	8,270	9,770
Packer	9,770	9,771
Packer	9,771	9,778
Tubing	9,778	9,810
Pup Joint	9,810	9,812

Assembly name: Cement Plug

Type	Top MD(ft)	Btm MD(ft)
Cement Plug	3,638	3,639

Assembly name: Cement Plug

Type	Top MD(ft)	Btm MD(ft)
Cement Plug	11,725	11,831
Cement Plug	11,831	11,838

MARKER DETAILS

Name	MD top(ft)
A-1	2,447.00
EST Base of <10000ppm	2,689.27
C-1	4,148.00
C-2	5,493.00
C-3	6,774.00
C-4	7,807.00
C-5	8,424.00
D-4	9,593.00
D-5	9,720.00
D-6	10,592.00
D-7	11,080.00


ABANDONMENT

Abandonment Tag Depth: N/A

Casing/Slots Details

CSG: 16.0000in, 62.58ppf, , , 23.00ft, 84.00ft
CSG: 10.7500in, 51.00ppf, , , 23.00ft, 52.00ft
CSG: 7.0000in, 29.00ppf, N-80, LT&C, 23.00ft, 1,544.00ft
CSG: 10.7500in, 45.50ppf, , , 52.00ft, 3,059.00ft
CSG: 7.0000in, 26.00ppf, N-80, LT&C, 1,544.00ft, 3,035.00ft
CSG: 10.7500in, 51.00ppf, , , 3,059.00ft, 3,620.00ft
CSG: 7.0000in, 23.00ppf, N-80, LT&C, 3,035.00ft, 5,090.00ft
CSG: 7.0000in, 26.00ppf, N-80, LT&C, 5,090.00ft, 8,076.00ft
CSG: 7.0000in, 29.00ppf, N-80, LT&C, 8,076.00ft, 9,985.00ft
CSG: 7.0000in, 29.00ppf, N-80, LT&C, 9,985.00ft, 10,004.00ft
CSG: 7.0000in, 29.00ppf, N-80, LT&C, 10,004.00ft, 11,831.00ft

Schematic

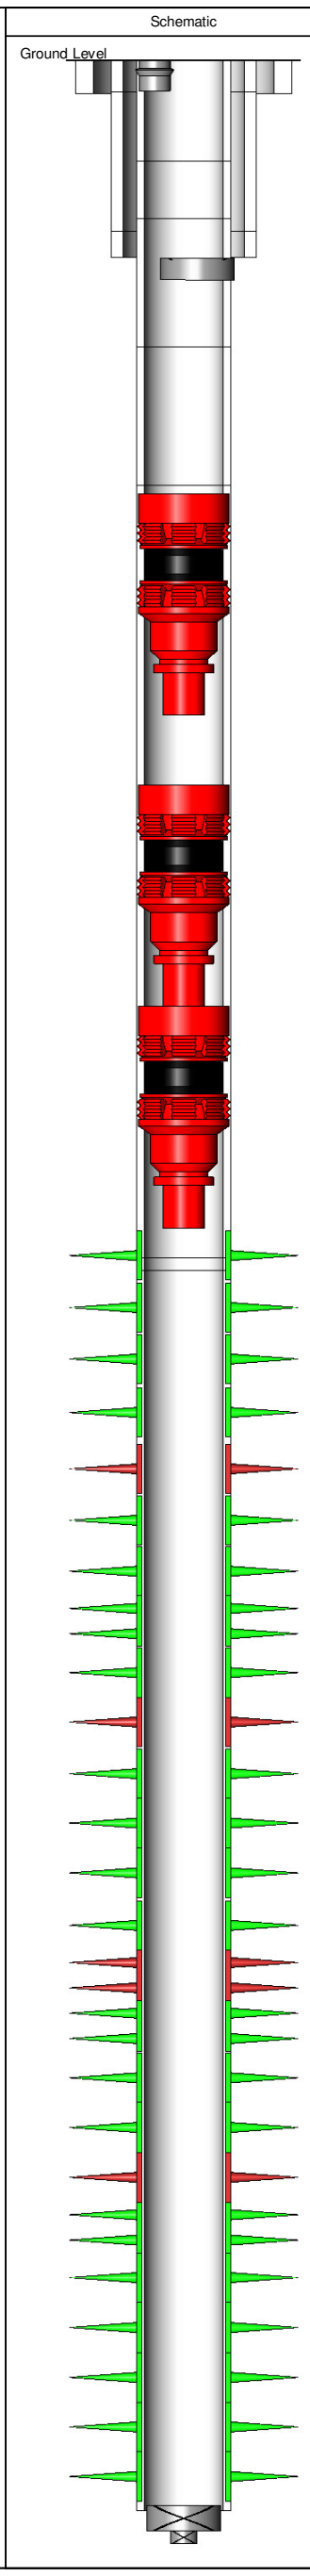

Hole Details

Obstruction Comments

OD(in) Top MD(ft) Base MD(ft)

Well Notes:

Initials: xyz Date: 7/23/2021
