
E&B Natural Resources Management Corporation

CURRENT WELLBORE DIAGRAM

Field	Poso Creek	**County**	Kern	**Spud Date**	01/16/2015	**KB**	13.5'
Lease	Section 5	**Well No.**	11-5XI	**Completed**	01/25/2015	**GL**	677.8'
Location	Sec 5 T28S/R27E BM:MD	**API No.**	030-47436	**Recompleted**		**Workover**	
				Well Type	Injector	**Lat/Long**	35.524599 / -119.082865

Hole Size:
Cond. 24" 0' - 54' (date unk).
14-3/4" 54' - 673' 01-17-15.
9-7/8" 673' - 2760' 01-20-15.

Junk:
None.

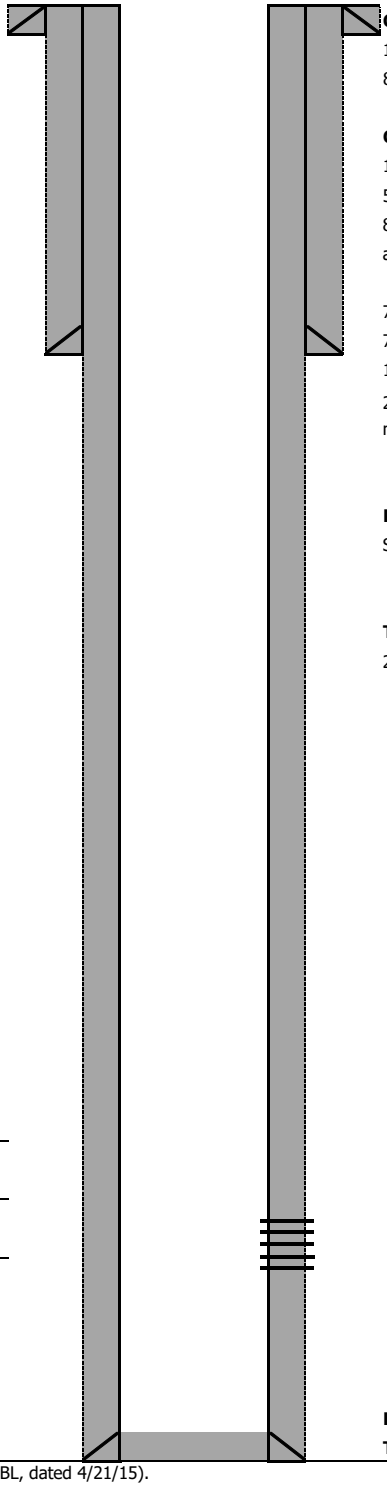

Cond:
16" 42.09#, A53B Sched. 10 0' - 54' (date unk).
81 cf Redi-mix cmt (date unk).

Csg:
10-3/4", 40.5#, J-55, ST&C 0' - 673':
506 cf Type III cmt, 35% Silica Flour, 2.5% Sodium Metascilicate, 2% CaCl2, 8 lbs/sx Kol-Seal, 0.25 lbs/sk Cello-Flake, **Top Job #1:** 25 cf cmt (same slurry mix as lead). Cmt RTS 01-17-15.

7", 23#, K-55, LT&C 0' - 2750':
785 cf Type III cmt, 35% Silica Flour, 10% Censopheres, 10% Gypsum, 2% CaCl2, 1% Sodium Metascilicate, 8 lbs/sk Kol-Seal, 0.25 lbs/sx Cello-Flake. Followed by 218 cf of tail cement (same slurry mix as lead).**Top Job #1:** 58 cf cmt (same slurry mix as lead. **Top Job #2:** Fill annulus w/11 cf cmt (same slurry mix). Cmt RTS 01-25-15.

Perfs:
Shot 1 (one) 0.25" JHPF @ 2360', 2370', 2387', 2402', & 2408' 05-19-15.

Tbg:
2-7/8" J-55 w/bell collar set @ 2446.32' 05-29-15

Markers:

Top Macoma Claystone
Shale/BFW @ 2201'

Top Etchegoin @ 2309'

Top Chanac @ 2412'

ED @ 2710' (CBL pick-up, insert @ 2414')
TD @ 2760'

Comments:
Flag Joint 2247' to 2266' (from CBL, dated 4/21/15).

Prepared By:
Richard Yoch
March 13, 2020
